

Anlegg: _____

Dato: _____

Kumnr.: _____

Tegningsnr.: _____

Revisjonsnr.: _____

Sjekkpunkter:**Deler er montert iht. tegning****Deler er montert iht. leverandørens anvisninger****Deler er sjekket for skader på epoxybelegg med følgende resultat:**


Ingen skader

Skadet


Skader er utbedret

Pakningsflater og pakninger er sjekket og funnet skadefrie eller byttet ut.**Bolter er dratt til og etterdratt med momentnøkkel iht. leverandørens anvisninger og figuren nedenfor.****Armatur er festet til konsoll og dratt til med moment iht. leverandørens anvisninger.****Armering av kum er utført som tegnet/beskrevet.****Armering av kum/forankringer og rørgjennomføringer er fotografert****Brannventilsikring og beskyttelseshette er festet til armatur**

Rekkefølge for å dra til og etterdra bolter på flenseforbindelser.

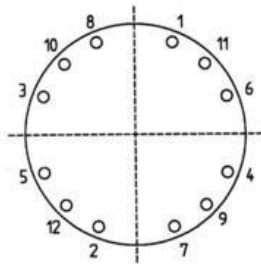

Tegning med avmerket tiltrekingsmoment [Nm]:

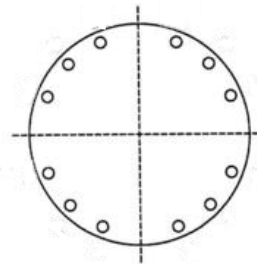

Tips: Om du setter et lite tusjmerke på selve bolten underveis, holder du lett styr på hvilke bolter som er dratt til og etterdratt, selv om du skulle bli avbrutt i arbeidet.

Ev. merknader

Montør sign:

Attestant sign:
